


智能水机健康报告

依托美的“水机博士”智慧解决方案，结合边缘智能和云智能技术，
全方位持续洞悉水机健康运行状况，为业主提供高效智能的水机售
后运维建议与服务



序列号 -
项目名称 i管家体验项目（大型水机）
项目地址 广东省佛山市顺德区美的工业城西区
报告期 2025-06-25 14:08:14

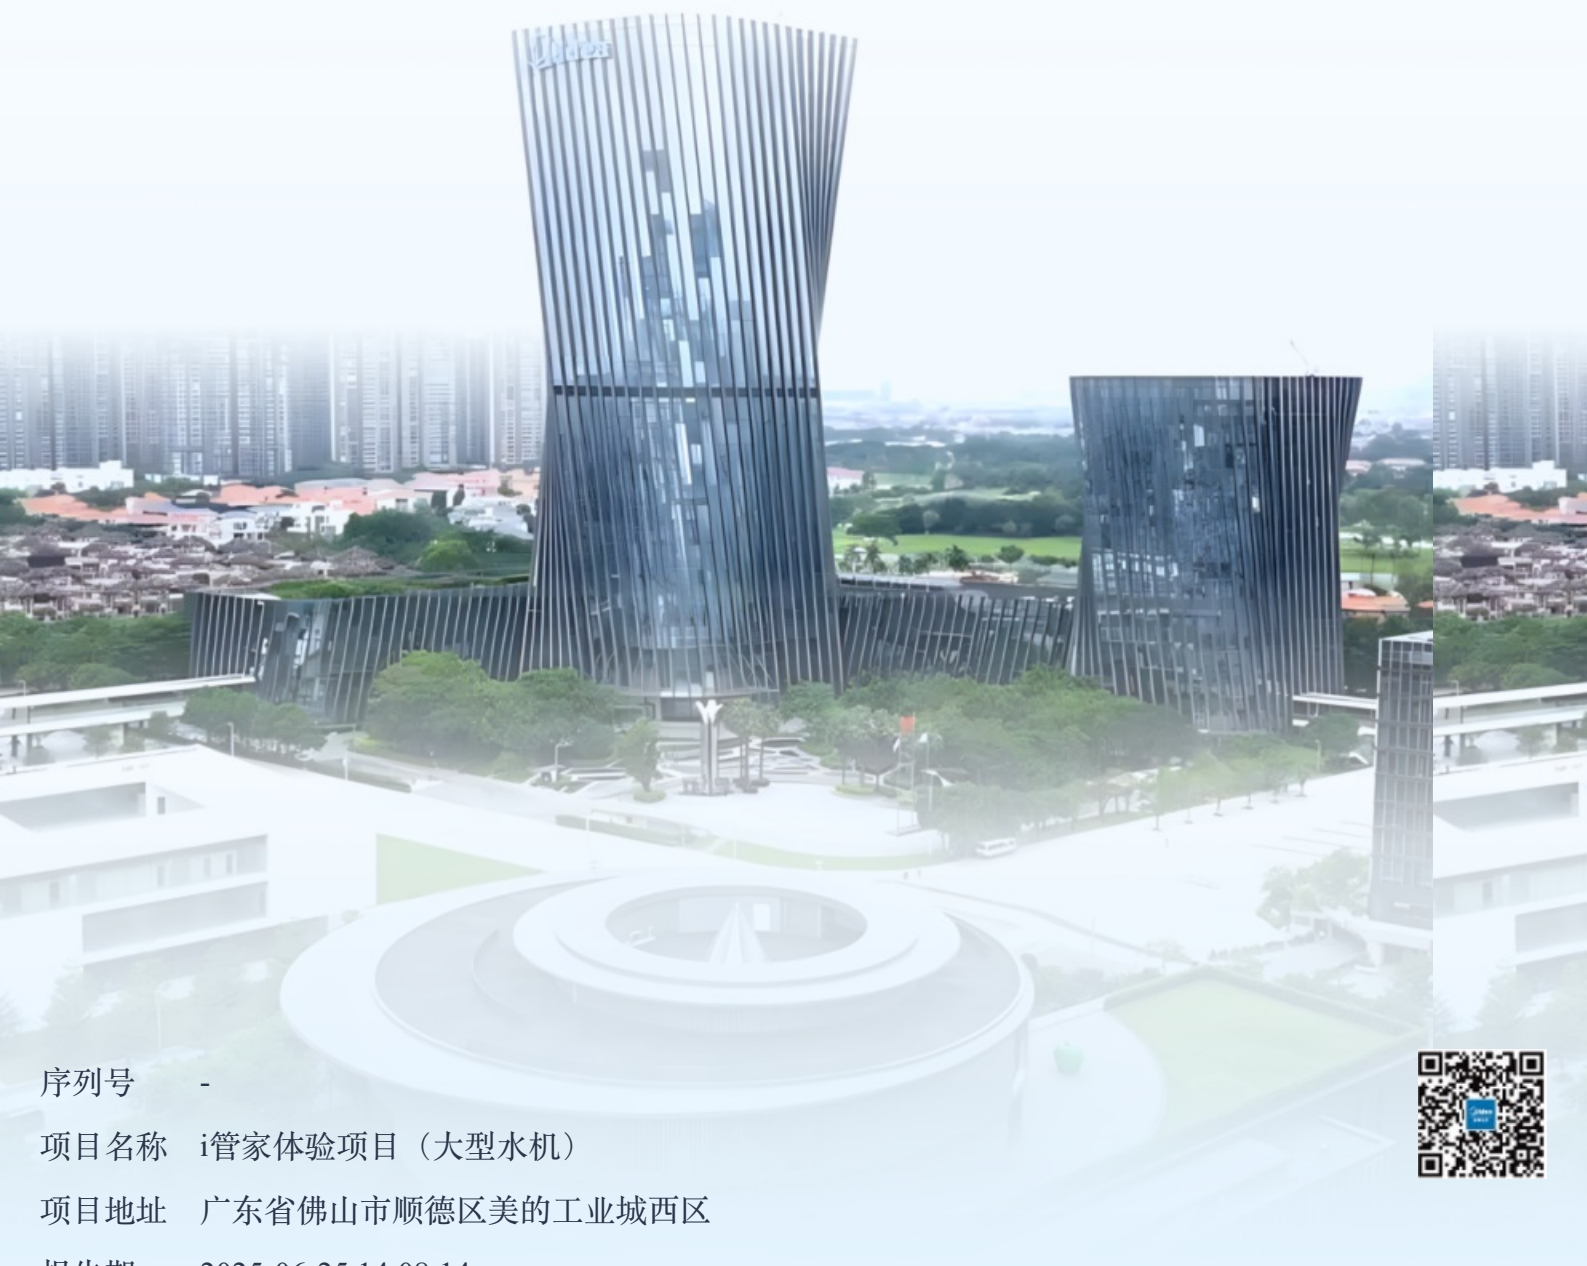

基础信息

客户名称	测试	安装详细地址	广东省佛山市顺德区美的工业城西区
机组型号	1	产品编号	-
控制程序版本号	1	电源	5
触屏程序版本号	-	出厂时间	2025-06-22
胀脉阀控制器版本	-	调试时间	2025-06-25

- 注：
1. 现场工作必须严格遵循国家法律法规和随附说明书相关的安全规范内容，以确保相关人员的安全！

2. 操作设备必须具备相应的资质证书，且操作过程必须符合操作规程！

1、外观检查

机组外观是否有损坏：	无
是否有零部件损坏：	无
是否存在保温破损：	无
其它：	无

2、电气回路检查

强弱电是否分开布线：	无
微机控制柜内部是否清扫：	无
启动柜内部是否清扫：	无
控制接线是否符合接线图：	无
控制电源配线连接状态：	异常
继电器状态：	异常
接触器状态：	异常
电源接线合规且无松动：	异常
启动柜接地状态是否正常：	异常
控制柜与启动柜之间的通讯线使用双绞屏蔽线且屏蔽层单侧接地：	否
高压启动柜安装完成后，是否有做启动柜交接实验：	异常

3、压缩机状态检查

低压机组点击绝缘电阻：	5
-------------	---

高压机组电机绝缘电阻：	5 MΩ
导页手动开关零位至满位：	正常

4、油系统检查

油加热是否通电状态：	否
高位油镜是否可见油位：	否
润滑油颜色确认：	浑浊
油箱温度：	5 °C
油泵状态：供油压差：	55 kPa
油泵电流：	5 A
油泵绝缘电阻：	55 MΩ

5、氟系统检查

出厂状态：	带氟出厂
不带氟出厂机组，气密性试验：	正常
保压前（气密性试验）：	5 MPa
保压后（气密性试验）：	5 MPa
不带氟出厂机组，真空试验：	正常
保压前（真空试验）：	555 MPa
保压后（真空试验）：	55 MPa
冷媒充注量（R134a）：	2 kg

单点漏率：

带氟出厂
5 g/年

设定参数与出厂参数是否一致：

是

具体差异：

6、水系统检查

管路清洗是否有杂质进入容器：

是

用户流量保护装置类别：

靶流

冷却侧动作是否正常：

正常

冷冻侧动作是否正常：

正常

水泵、冷却塔检查（流量大于机组额定流量）

类别	形式	流量m³/h	扬程m
冷冻水泵	并联	3	3
冷却水泵	并联	3	3
冷却塔	开式	22	2
热回收	并联	1	1

水质检查

项目	PH值	电导率	是否清澈
冷冻水	5	5	是
冷却水	6	6	是
热回收	3	3	是

7、报警及网络检查

网关类型：

普通网关

网络状态：

信号强

网关固定版本：

5

8、微机控制柜参数检查

用户参数设置

制冷/制热目标温度：

0 °C

蒸发器实际控制温度：

7 °C

退出暂停温差：

0 °C

进入暂停温差：

0 °C

容量调节保持温差：

0 °C

冷却塔风机调节温差：

0 °C

冷却塔风机组1关闭温度：

19 °C

冷却塔风机组1开启温度：

0 °C

冷却塔风机组2关闭温度：

17 °C

冷却塔风机组2开启温度：

34 °C

串口设置

波特率：

9600

站号地址：

校验位：

模式设置

控制模式：

就地

运行模式：

制冷

进出水控制：

出水控制

常规设置

主机额定电流：

0 A

当地最低大气压力：

98 kPa

压力传感器上限设置：

2000 kPa

蒸发器目标液位：

0 mm

制冷满载功率：

0 kW

蓄冰满载功率：

0 kW

压缩机停机间隔：

15 S

启动间隔：90 S

快速启动备妥信号判断延时：1 S

控制参数

回油电磁阀开启时间：0 s

回油电磁阀关闭时间：500 s

油加热开启温度：41 °C

油加热关闭温度：46 °C

油泵关闭时间：0 s

导叶执行器行程：60 s

变频器参数

变频器类型：汇川

波特率(bps)：9600

读起始地址：12289

写起始地址：16386

尊敬的用户：

非常感谢您选用美的楼宇科技的产品，“把复杂留给美的，让用户更简单”是我们的经营理念，我们将竭诚为您提供“快捷、专业、智能的用户服务”。为了给您带来更好的用户服务体验，请留下您的宝贵意见和建议，非常感谢您的支持！

用户意见：

无

现场培训效果：

无

美的服务人员：

—

电话：

13726259684

日期：

2025-06-25

机组运行数据记录表

项目名称：i管家体验项目（大型水机） 机组型号：1 出厂编号：-

测试项目		FX	1	2	3	4	5	6
		时：分						
记录时间			2025-06-25 14:03:51	2025-06-25 14:05:52	2025-06-25 14:06:04	2025-06-25 14:06:15	2025-06-25 14:06:25	2025-06-25 14:06:35
冷冻水	入口温度	°C	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	出口温度	°C	-40	-40	-40	-40	-40	-40
冷却水	入口温度	°C	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	出口温度	°C	0	0	0	0	0	0
蒸发器	蒸发压力	kPa	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	饱和温度	°C	-26	-26	-26	-26	-26	-26
	端温差	°C	-13	-13	-13	-13	-13	-13
冷凝器	冷凝压力	kPa	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	饱和温度	°C	-26	-26	-26	-26	-26	-26
	端温差	°C	13	13	13	13	13	13
油系统	油箱温度	°C	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	供油温度	°C	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	油箱压力	MPa	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	供油压力	MPa	0	0	0	0	0	0
	供油压差	MPa	100	100	100	100	100	100
导叶开度			0	0	0	0	0	0
电流百分比			0	0	0	0	0	0

其他检查事项：

1. 客户设定的目标温度25°C；用户侧供电电压为 22/ 22/ 33V。
2. 运行状态下机组表现： 喷管检查： 无异常震动，无异响，请注明情况
3. 制冷系统检查，氟侧系统过滤器前后温差： 5°C（平稳运行状态下，温差应低于5°C）
4. 常规机组正常运行状态下蒸发压力正常范围220~400kPa,冷凝压力正常范围700~1000kPa。平稳运行状态下，换热器端温差应小于3°C°C，高于此温差时，换热器换热效率降低，需进行清洗，建议最长一年清洗一次，如果水质较差，清洗频次需增加。敬请关注日常水系统水质管理。（注:换热器清洗属于有偿服务项目。）

问题及处理结果：

无

机组状态评价及整改建议：

1) 客户开机前检查情况 正常

无

2) 运行状态下机组表现 正常

无

3) 其它事项

无

签字验收

美的服务人员姓名： —

美的服务人员电话： 13726259684

签名日期： 2025-06-25



美的服务人员签名：

客户代表人员姓名： 很好

客户代表人员电话： 13726259684

签名日期： 2025-06-25



客户代表人员签名：
